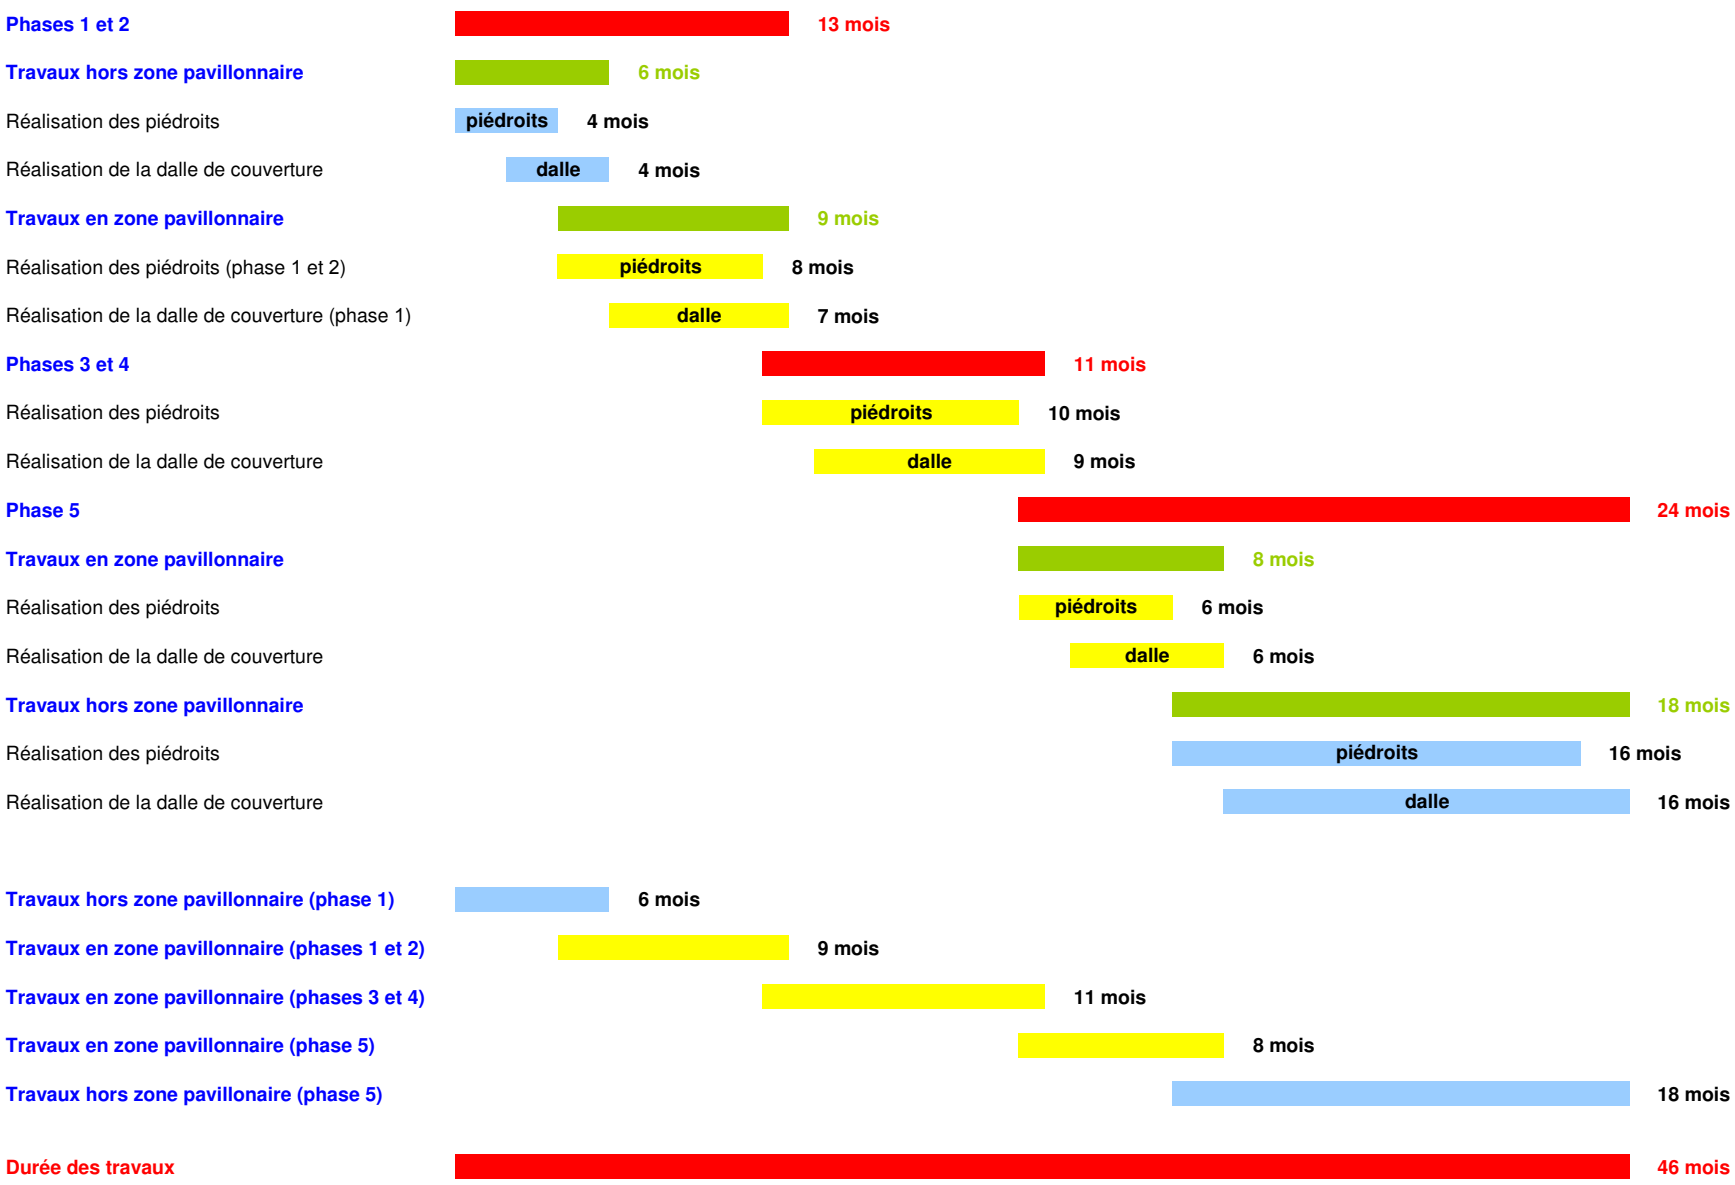
Phases 1 et 2
13 mois
Travaux hors zone pavillonnaire
6 mois
Réalisation des piédroits
piédroits
4 mois
Réalisation de la dalle de couverture
dalle
4 mois
Travaux en zone pavillonnaire
9 mois
Réalisation des piédroits (phase 1 et 2)
piédroits
8 mois
Réalisation de la dalle de couverture (phase 1)
dalle
7 mois
Phases 3 et 4
11 mois
Réalisation des piédroits
piédroits
10 mois
Réalisation de la dalle de couverture
dalle
9 mois
Phase 5
24 mois
Travaux en zone pavillonnaire
8 mois
Réalisation des piédroits
piédroits
6 mois
Réalisation de la dalle de couverture
dalle
6 mois
Travaux hors zone pavillonnaire
18 mois
Réalisation des piédroits
piédroits
16 mois
Réalisation de la dalle de couverture
dalle
16 mois
Travaux hors zone pavillonnaire (phase 1)
6 mois
Travaux en zone pavillonnaire (phases 1 et 2)
9 mois
Travaux en zone pavillonnaire (phases 3 et 4)
11 mois
Travaux en zone pavillonnaire (phase 5)
8 mois
Travaux hors zone pavillonaire (phase 5)
18 mois
Durée des travaux
46 mois
